



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

COMUNE di CENTOLA

Provincia di Salerno

PNRR - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1.

"Piani per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia"

RICONVERSIONE DI UN EX EDIFICIO SCOLASTICO DI PROPRIETÀ COMUNALE PER LA
CREAZIONE DI UN ASILO NIDO IN VIA MADONNA DELLE GRAZIE ALLA FRAZIONE FORIA
DEL COMUNE DI CENTOLA

Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU

CUP:B94D25000750001

PROGETTO ESECUTIVO

art.41 D.Lgs. n.36/2023 _All. I.7

CRONOPROGRAMMA

13

scala -



RESPONSABILE SETTORE

lavori pubblici
Arch. Magno Battipaglia



RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

SETTORE lavori pubblici
Geom. Remo Fedullo

PROGETTISTI

SETTORE lavori pubblici
ESPERTO TECNICO profilo middle
Arch. Antonio Greco




ESPERTO TECNICO profilo junior
Arch. Aniello Maria Feola



Centola, luglio 2025

N. ord.	Cod.	Attività	Inizio	Fine	Durata gg.
1	A	Consegna dei lavori	01/10/2025	02/10/2025	1
2	B	Allestimento cantiere	02/10/2025	07/10/2025	5
3	C.1	Rimozione infissi, rimozioni apparecchiature/dispositivi esistenti e demolizioni	08/10/2025	23/10/2025	15
4	C.2	Realizzazione opere murarie e telai controsoffitti	24/10/2025	23/12/2025	60
5	C.3	Installazioni impiantistiche	07/01/2026	06/02/2026	30
6	C.4	Ultimazione controsoffitti e opere di finitura interne	09/02/2026	26/03/2026	45
7	C.5	Interventi in copertura	27/03/2026	26/04/2026	30
8	C.6	Interventi sulle facciate	27/03/2026	11/05/2026	45
9	C.7	Pulizia cantiere	12/05/2026	27/05/2026	15
10	D	Fine lavori	01/10/2025	29/05/2026	240

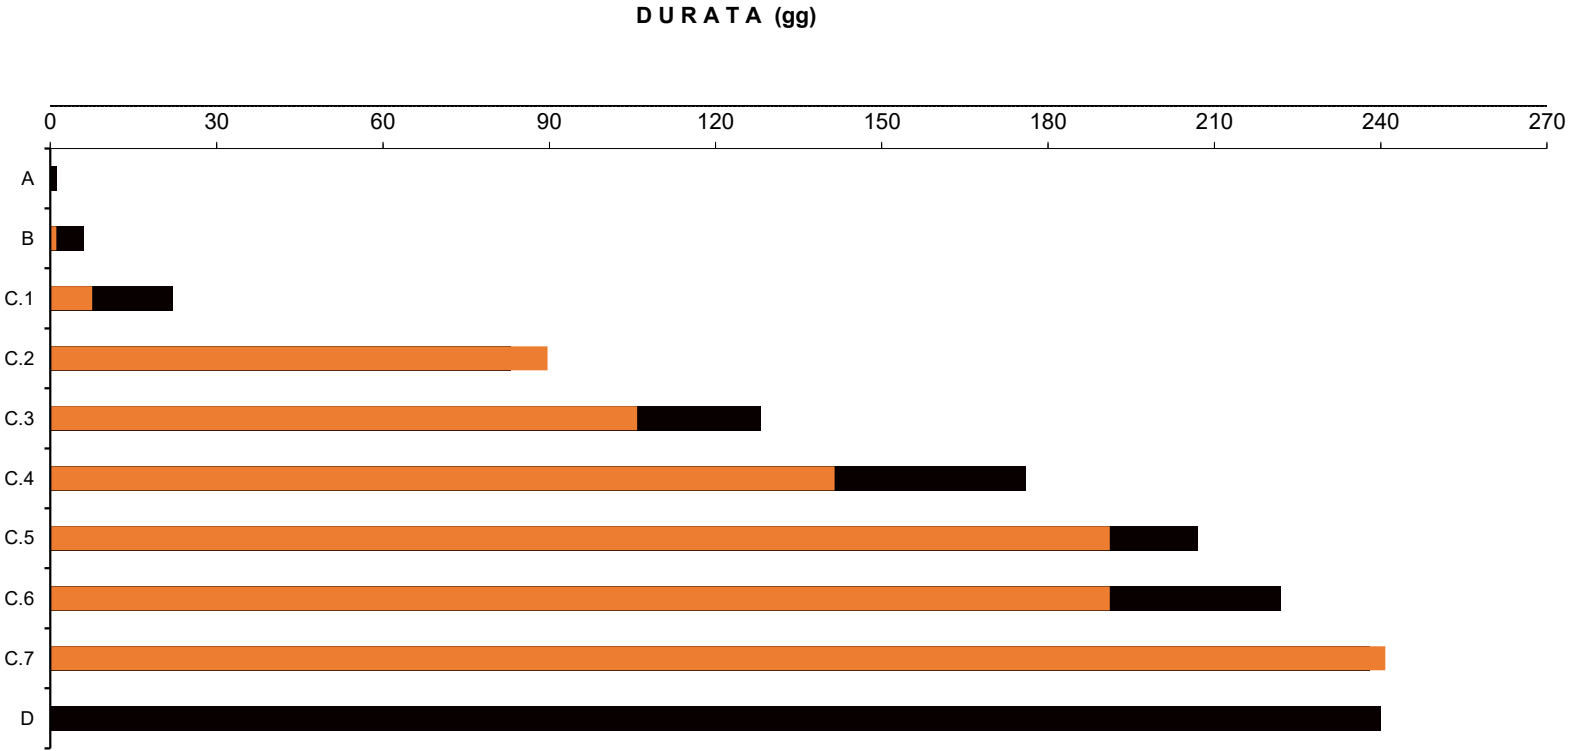

TC

240
naturali consecutivi

gg.

Inizio dei
lavori

0 gg

Fine lavori

240 gg
